

2020 年第二季度新校区建设简报


新校区建设工作 2020 年 1—3 月受疫情影响，主要工作是按照国家、省市以及学校要求进行疫情防控及复工复产准备。第二季度，在学校党委、行政及新校区建设指挥部的正确领导下，基建处与代建单位科学制定详细、具体的工作计划，要求、督促各参建方开组马力，保质保量做好规划设计、报建报批及工程施工。

一、工程建设情况

（一）一期工程

1. 一期一标（1—3#栋宿舍）建设情况

一期一标自 2019 年 12 月 27 日完成主体结构封顶，2020 年第一季度施工进度滞后，第二季度主要完成墙体砌筑、外墙砖铺贴、内粉刷、腻子、屋面防水、屋面盖瓦、屋面保温工程等。

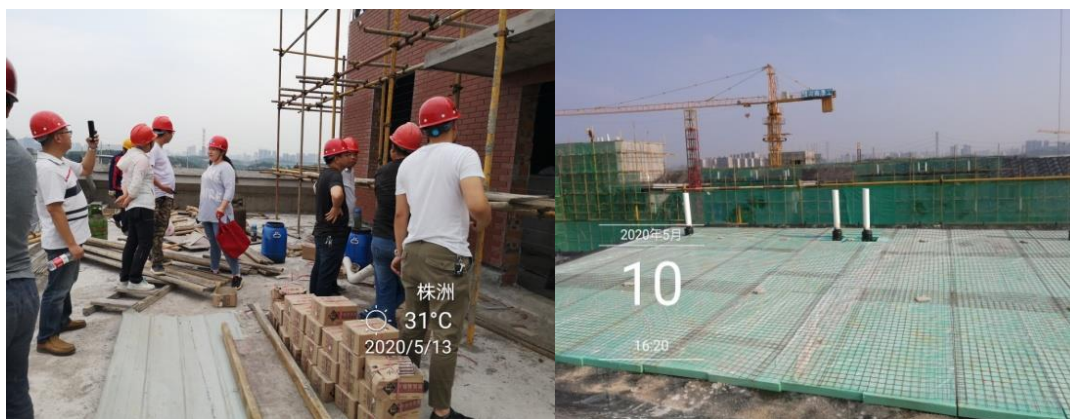

2. 一期二标（实训二）建设情况

一期二标自 2019 年 12 月 29 日完成主体结构封顶，第一季度进度滞后，第二季度主要完成坡屋面盖瓦、外墙砖、铝合金外窗、石材幕墙龙骨、外墙内保温材料、平屋面防水、坡屋顶顶棚腻子施工、卫生间找平、内墙仿瓷涂料、地板砖和墙裙工程等。



3. 一期附属工程（道路管网）建设情况

一期附属工程于 2020 年 4 月 2 日完成中标通知书发放，第二季度已完成了合同签订、临时道路、板房搭建工作，因与一期工程有交叉作业，待一期工程外架拆除后随时可以进入施工。



(二) 二期工程

1. 二期一标（4—6 栋宿舍）建设情况

二期一标于 3 月 3 日经过示范区卫健委、质监站、学林街道、社区等相关部门对疫情进行检查合格后部分管理人员复工、复

产，做复工前的准备工作。4月26日完成施工许可证办理，并于4月30日召开第一次工地例会正式开工。截至6月份，主要完成临建设施、施工方案编制与审核、塔吊基础施工、桩基础施工、条形基础土方开挖、桩头砼破除、桩基检测、条形基础换填、条形基础土方开挖、垫层砼浇筑、挡土墙基础换填工程等。



2. 二期二标（食堂、公共教学楼等）情况

二期二标于3月11日完成中标公示，后因有单位投诉质疑暂未进场，该标段施工建设未能按原计划进度推进。

3. 二期附属工程建设情况

二期附属工程于5月9日召开了预算编制会议。预算编制单位启动预算编制前期准备工作，并于6月份完成预算初稿编制；同时，基建处、代建单位督促设计公司对二期附属工程施工图纸进行了进一步的优化，并于6月份完成施工图设计。

（三）三期工程

学校于4月7日召开校长办公会，同意启动三期代建招标工作。第二季度，三期工程完成了采购计划申报、采购需求、招标代理比选、招标书制定挂网工作，确定于7月28日开标。



（四）其它工程

1. 横石干渠工程建设情况

横石干渠工程，通过学校领导、基建、代建各方共同努力，已列入市政 3P 项目，由市水务集团于 6 月 12 日开工建设。




2. 市政污水工程建设情况

市政污水工程穿过新校区，通过学校领导、基建、代建各方共同努力，也已列入市政 3P 项目，红线内的污水管由市水务集团于 4 月 26 日开工建设，红线内的管道基本预埋完成，只剩下与横石干渠有交叉作业的地方未预埋。




3. 新校区室外附属 BIM 项目

新校区室外附属工程 BIM 项目已于 4 月 1 日完成初步成果交付。

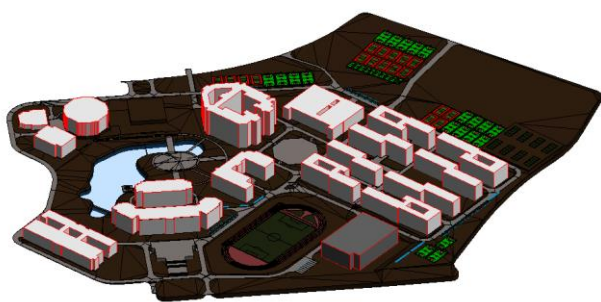

景观及道路模型

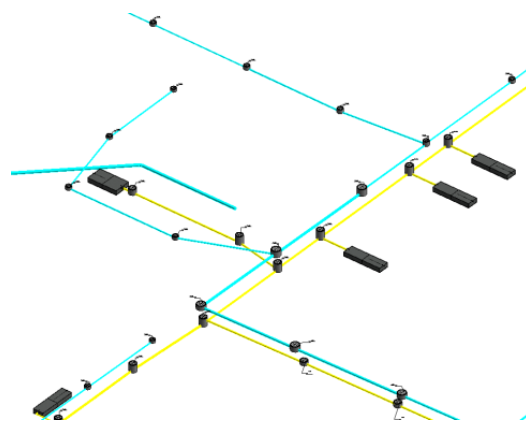

污水与雨水模型部分截图

4. 中心配电站 10KV 配电工程建设情况

中心配电站 10KV 配电工程已于 6 月 18 日完成中标公示、6 月 22 日发放中标通知书；第二季度完成合同谈判与修改工作、施工单位进场前团队组织工作、临建设施搭建及准备工作。

湖南铁道职业技术学院新校区建设项目10KV配电设备采购项目中标公示

【信息来源:】 【信息时间: 2020-06-18 阅读次数: 8181】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

湖南铁道职业技术学院 新校区建设项目10KV配电设备采购项目 公开招标中标公告

受湖南铁道职业技术学院的委托, 中科高盛咨询集团有限公司对新校区建设项目10KV配电设备采购项目进行公开招标, 经评标委员会评审, 采购人确认, 现将中标信息公告如下:

一、采购项目信息

项目名称: 湖南铁道职业技术学院新校区建设项目10KV配电设备采购项目

政府采购编号: 湘财采计[2020]000331号

代理机构编号: ZKGSF(ZB)-20201005

采购方式: 公开招标

采购预算: ¥8544800.10元

二、报批报建及规划设计情况

1、4月26日, 二期一标完成施工许可证的办证工作, 证书编号为430212202004240101。

2、二期预留用地完成勘测定界和规划红线。

3、一期附属工程签订合同, 施工许可证办理资料已进窗。

4、确定三期工程全过程代建方式, 并启动三期工程设计方案修改工作。

5、6月10日, 新校区一、二期绿色建筑评价评审会由株洲市建设科技与建筑节能协会组织召开, 所有单体达到一星级标准, 部分内容修改完善后可申请绿色标识。

6、6月份完成南校区绿化景观设计, 于6月22日提交到区规划与自然资源局初审并通过; 7月10日, 区规划局组织了方案评审会, 设计方案通过评审并获规划局同意。
